
Ai ảnh hưởng đến P-143 và team làm gì với họ

Team Fantastic4 · Dự án P-143 — Invoice Reconciliation Agent
AI20K Build Phase · 13/10/2026 (tuần 4 / 5)

Phạm vi (Gate 0). Sản phẩm: agent đối chiếu 3 chiều Hóa đơn ↔ PO ↔ Phiếu nhập kho cho kế toán, pilot tại **Công ty X** (tên ẩn). **Mục tiêu 1–3 tháng:** trước Demo Day (tuần 5) có live URL chạy đủ luồng, recall chỗ lệch ≥ 98%, và một buổi kế toán dùng thử trên dữ liệu thật đo được thời gian đối chiếu. **Thành viên:** Nguyễn Quang Huy (BA · PM · frontend — trưởng nhóm, tổng hợp bài), Nguyễn Ngọc Linh (ML đọc hóa đơn), Nguyễn Văn Sơn (ML đối chiếu & an toàn AI), Lê Thị Hoài Thương (backend · tech lead). **Công cụ:** GitHub + Markdown/HTML → PDF.

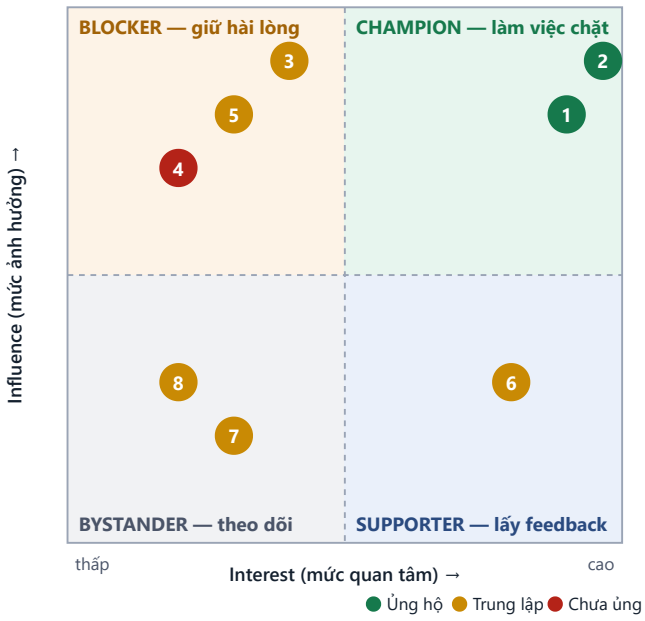

#	Stakeholder cụ thể	Vùng	Stance thực tế & lý do
1	Mentor của P-143 (AI20K)	Champion	Ủng hộ Góp ý trực tiếp (bỏ bút toán), muốn xem cảnh sửa số cạnh ảnh gốc.
2	Thương — tech lead, chốt release	Champion	Ủng hộ Quyết release và review mọi PR vào nhánh chính → dễ quá tải.
3	Kế toán trưởng Công ty X	Blocker	Trung lập Đã cho dữ liệu để demo, nhưng dung sai, ngưỡng duyệt cấp 2 (Q1–Q6) chưa chốt; chưa hẹn buổi dùng thử.
4	Người phụ trách IT / bảo mật dữ liệu Công ty X	Blocker	Chưa ủng hộ Mới đồng ý gửi ảnh scan ra Gemini cho buổi demo 08/10; chưa đồng ý cho pilot.
5	Ban giám khảo Demo Day AI20K	Blocker	Trung lập Chấm theo 10 deliverables và bằng chứng, không theo lời hứa.
6	Kế toán viên Công ty X (người dùng buổi thử)	Supporter	Trung lập Quadrant gợi ý "ủng hộ" nhưng **chưa dùng thử** lần nào, chưa có cơ sở.
7	Nhà cung cấp của Công ty X	Bystander	Trung lập Bị ảnh hưởng gián tiếp: HĐ lệch bị giữ lại, lệch tài khoản phải gọi xác minh.
8	SME dùng MISA/Fast (khách H2)	Bystander	Trung lập Thị trường giai đoạn sau, chưa tiếp xúc.

4 stakeholder ưu tiên — hành động trong 1–2 tuần (14/10 → 23/10)

Stakeholder	Họ quan tâm	Có thể giúp / cản	Hành động cụ thể · owner · hạn
Tận dụng sự ủng hộ			
1. Mentor	Sản phẩm giải trình được, chạy trên dữ liệu thật, đủ deliverable.	Giúp: mở lời với KTT Công ty X, xác nhận Langfuse đủ cho deliverable *AI Logs*.	Gửi link nhánh `demo/2026-10-09` + biên bản nghiệm thu (35/49 tiêu chí đạt) **trước thứ Sáu 16/10**; nhờ mentor giới thiệu KTT cho buổi dùng thử tuần 19–23/10. **Owner: Sơn.**
2. Thương (tech lead)	Hệ thống ổn định khi demo, không bị nghẽn review.	Giúp: quyết release, deploy. Cản (vô tình): một mình review mọi PR → cả team chờ.	Từ **14/10**: Linh ↔ Sơn review chéo PR của nhau, Thương chỉ review PR chạm `core/gateway`; chốt ngày freeze code **21/10**. **Owner: Thương.**
Ưu tiên thuyết phục			
3. KTT Công ty X	Không chi sai tiền, kiểm soát được việc duyệt, không thêm việc cho KTV.	Giúp: cho người dùng thử, chốt dung sai/ngưỡng. Cản: không có buổi thử → không đo được mục tiêu giảm 50% thời gian.	Gửi pitch 1 trang (Trang 2) + 5 câu hỏi cần chốt (dung sai giá/SL, ngưỡng cấp 2, nhóm thuế) **trước 16/10**; xin buổi 2 giờ trong **19–23/10**. **Owner: Huy.**
4. IT / bảo mật Công ty X	Số tài khoản, MST, giá mua không lọt ra ngoài.	Cản: không cho gửi ảnh ra Gemini → mất đường đọc scan cho pilot.	Gửi tờ "Dữ liệu đi đâu" **trước 20/10**: chỉ ảnh scan gửi Gemini API; dữ liệu thật chạy local, không commit, không deploy; trace Langfuse tự host, che số tài khoản; phương án B: chỉ nhận XML + PDF có chữ. **Owner: Linh** (Thương duyệt phần hạ tầng).

Pitch cho Kế toán trưởng Công ty X

Stakeholder #3 (Blocker, Trung lập)
Cấu trúc: Kết luận → Lý do → Bằng chứng → Small ask

Kết luận: Đề nghị anh/chị cho 2 kế toán viên dùng thử P-143 trong một buổi 2 giờ, tuần 19–23/10, trên các hóa đơn Công ty X đã cung cấp — để đo xem thời gian đối chiếu giảm được bao nhiêu so với làm tay.

Lý do anh/chị nên quan tâm

- **Không chi sai tiền:** hệ thống không bao giờ tự duyệt. Mọi chỗ lệch có mã, công thức và nguồn; duyệt 2 cấp, người duyệt cấp 2 phải khác cấp 1 (kiểm ở backend).
- **Bớt việc tay cuối tháng:** KTV chỉ xem hóa đơn 🟡/🔴 và ô có dấu ❗, không dò lại từng dòng hóa đơn 🟢.
- **Chặn kiểu lừa đảo hay gặp:** số tài khoản nhận tiền khác tài khoản đã lưu thì giữ lại, yêu cầu gọi xác minh.

Bằng chứng đang có (không hơn)

- Eval 300 HĐ tổng hợp (23/09): precision chỗ lệch **100%**, **0** HĐ sai mà vẫn xếp 🟢; recall chỗ lệch **88,4%** — *chưa đạt mục tiêu 98%.*
- Chạy thử trên 31 bộ chứng từ thật của Công ty X (08/10): bắt đúng 1 HĐ kho nhận thiếu và 1 HĐ số tài khoản lệch một chữ số.
- Nghiệm thu 09/10: 12/12 luồng người dùng chạy được; 35/49 tiêu chí Đạt, 13 Một phần.
- Chi phí AI ≈ 0,30 USD cho một lượt đọc 11 HĐ scan.

Chưa có số đo "giảm 50% thời gian" — chính buổi dùng thử sẽ đo điều này.

Small ask: Anh/chị đồng ý (1) một buổi 2 giờ với 2 KTV trong tuần 19–23/10, và (2) ký xác nhận bảng số phút/hóa đơn trước và sau. Team chuẩn bị dữ liệu, máy chạy local, kịch bản và biên bản.

Phản biện có khả năng nhất

"AI đọc số sai thì kế toán vẫn phải kiểm lại toàn bộ — không tiết kiệm được gì, lại thêm rủi ro."

Trả lời bằng bằng chứng & hành động giảm rủi ro

- Mỗi trang scan được AI đọc 2 lần độc lập; hai lần lệch → ô có ❗ và hóa đơn **không thể** xếp 🟢. MST được kiểm chữ số kiểm tra.
- Trên 300 HĐ: 0 hóa đơn sai mà vẫn 🟢 → KTV chỉ kiểm phần máy đã đánh dấu.
- Buổi thử đo đúng câu hỏi này. Nếu thời gian không giảm, team đề xuất chỉ dùng cho HĐ XML (đọc chính xác 100%) và dừng phần scan.

RACI — 6 việc quan trọng đến Demo Day và tuần dùng thử

Công việc (hạn)	Huy PM·BA·FE	Linh ML đọc	Sơn ML đối chiếu	Thương BE·TL	Mentor	KTT Công ty X
1. Buổi kế toán dùng thử + biên bản đo thời gian (23/10)	**A/R**	**R**	**I**	**C**	**I**	**C**
2. Xin chấp thuận dữ liệu cho pilot — tờ "Dữ liệu đi đâu" (20/10)	**C**	**R**	**I**	**A**	**I**	**C**
3. Recall chỗ lệch ≥ 98%, recall gian lận ≥ 95% trên eval 300 HĐ (23/10)	**I**	**A**	**R**	**C**	**I**	**—**
4. Hiệu chỉnh ngưỡng tin cậy đọc scan trên dữ liệu thật (21/10)	**I**	**R**	**A**	**C**	**—**	**—**
5. Deploy bản cuối: live URL API + giao diện, quyết release (24/10)	**R**	**I**	**I**	**A/R**	**I**	**—**
6. Pitch deck 10 slide + video ≤ 5 phút + đủ 10 deliverables (25/10)	**A/R**	**R**	**R**	**R**	**C**	**I**

Mỗi hàng có đúng 1 A; mỗi thành viên là A của ít nhất 1 việc. Việc 2, 3, 4 tách R và A: hai bạn ML nghiệm thu chéo cho nhau (Linh ↔ Sơn), tech lead không phải duyệt mọi thứ. Việc 1, 5, 6 một người vừa R vừa A vì đó là phần việc người đó sở hữu.

Team 4 người cần cấu trúc và năng lực gì

Giai đoạn: MVP → pilot (H1)
Không tuyển thêm trong 30 ngày tới

Architecture: Embedded

Team chỉ có 1 sản phẩm và 4 người, nên năng lực AI (Linh, Sơn) nằm ngay trong squad, làm cùng backend và giao diện theo hợp đồng dữ liệu `ExtractionResult → ReconciliationResult → API`. Một nhóm AI trung tâm (Centralized/Hybrid) chỉ có ý nghĩa khi có nhiều sản phẩm cần dùng chung — ở H1 nó chỉ thêm một lớp bàn giao.

Core roles — cần ngay (đã có người)

Vai trò	Người	Sở hữu
AI Product / PM + Frontend	Huy	Yêu cầu, ưu tiên, stakeholder, giao diện React
Backend / Tech lead	Thương	Nền tảng, luồng LangGraph, gateway, deploy, release
AI Engineer — đọc hóa đơn	Linh	OCR/LLM đọc scan, độ tin cậy từng trường
AI Engineer — đối chiếu & an toàn	Sơn	Khớp dòng, mã ngoại lệ, thuế, gian lận
Domain Expert kế toán / thuế	*chưa có*	→ Partner (xem dưới)

Extended — chỉ khi scale (H2, SME dùng MISA/Fast)

- **Forward Deployed Engineer:** nối MISA/Fast, onboard khách < 1 tuần.
- **MLOps / Evals:** khi phải theo dõi nhiều tenant, nhiều mẫu hóa đơn.
- **Legal / Compliance:** hóa đơn điện tử, bảo vệ dữ liệu cá nhân khi giữ dữ liệu của nhiều khách.

Không đặt UX designer, AI Ethics riêng: prototype đã có bộ màu và luồng; phạm vi H1 là 1 khách nội bộ.

Capability gap → Priority Resourcing

Capability gap	Cách bổ sung	Vì sao	Khi nào cần
1. Nghiệp vụ kế toán & thuế VN — dung sai, ngưỡng duyệt cấp 2, nhóm thuế mặt hàng	Partner KTT Công ty X + mentor	Quyết định nghiệp vụ phải đến từ người dùng thật; cần vài giờ trả lời câu hỏi, không cần người full-time. 6 câu hỏi Q1–Q6 đang treo chính vì thiếu năng lực này.	Trước buổi dùng thử (19/10)
2. Vận hành hạ tầng — Postgres 18 (cần `uuidv7()`), deploy, Langfuse	Outsource dịch vụ managed	Thương (tech lead) đã giữ review, tích hợp và release; tự dựng và giữ server lấy thời gian khỏi luồng xử lý chính. Dịch vụ managed rẻ ở quy mô demo. Phải kiểm nơi deploy có Postgres 18, DB miễn phí không bị xóa sau 30 ngày.	Trước deploy cuối (24/10)
3. Đọc scan tiếng Việt chất lượng cao	Outsource Gemini API (đã chọn, ADR)	Team không có GPU, chỉ 1 người làm phần đọc; tự host mô hình mở là việc của H2. Đổi lại phụ thuộc chấp thuận dữ liệu (stakeholder #4) → có phương án B chỉ XML + PDF có chữ.	Đang dùng; xem lại khi khách H2 bắt buộc tự host
4. Evals & phát hiện gian lận	**Không thuê** — nâng năng lực nội bộ	Đây là lõi sản phẩm; thuê ngoài thì team mất khả năng giải trình con số. Đưa vào Growth Plan (Trang 4, Sơn).	30 ngày tới

Hire: chưa tuyển. Điều kiện để mở tuyển 1 backend/DevOps: có 3 khách H2 trả tiền (mục tiêu H2 trong BRIEF_v3).

Squad Goal: "Team Fantastic4 sở hữu luồng đối chiếu 3 chiều Hóa đơn – PO – Phiếu nhập, và chịu trách nhiệm đưa việc đối chiếu của kế toán Công ty X từ dò tay cuối tháng đến chỗ hệ thống tự xếp Khớp / Cần kiểm tra / Lệch, có giải thích và duyệt 2 cấp, được kế toán dùng thử trên dữ liệu thật trước Demo Day."

Team đang yếu ở đâu và 30 ngày tới làm gì

Chấm 13/10/2026 · thang 1–5
30 ngày: 14/10 → 12/11/2026

Team Health Score

Khía cạnh	Huy	Linh	Sơn	Thương	TB	Chênh	Bằng chứng
Chất lượng AI	3	3	2	3	**2,75**	1	Precision 100%, 0 sai mà 🟢; nhưng recall chỗ lệch 88,4% (mục tiêu 98%), recall gian lận 30% (mục tiêu 95%); FRD-02/03/05, ITM-01/02 bắt được 0%.
Tiến độ	3	3	3	4	**3,25**	1	Nhánh demo 09/10 chạy 12/12 luồng; nhưng JOURNAL tuần 3 còn trống, Q1–Q6 chưa chốt, chưa có live URL bản cuối.
Tinh thần team	4	4	4	2	**3,5**	**2**	Quy trình hiện tại: tech lead review mọi PR vào nhánh chính và tự ghép các phần (TEAM_PLAN §1). Chưa có review chéo.
Tốc độ ra sản phẩm	4	4	3	4	**3,75**	1	Sửa lỗi đối chiếu scan → lên nhánh demo trong ngày; lô 3 file scan đọc xong trong 40 giây.

Điểm từng người do 4 thành viên tự chấm tại buổi lab (Phase 4.1), bám sát các số đo kỹ thuật và hiện trạng phối hợp từ repo P-143 (cột bằng chứng); theo dõi và cập nhật qua các buổi retro hàng tuần.

Đọc kết quả

- **Thấp nhất:** Chất lượng AI (2,75) — bỏ sót gian lận là đúng loại lỗi làm chi sai tiền.
- **Chênh nhiều nhất:** Tinh thần team (2 điểm). Thương chấm thấp vì mọi PR và tích hợp dồn về tech lead; 3 người còn lại không thấy áp lực này.
- **Vấn đề ưu tiên:** recall gian lận 30% *và* nút thắt review ở tech lead. Không xử lý thì không vào được buổi dùng thử (Trang 2) và Demo Day với con số dám nói.

Competency cần nâng

```
Sơn — AI Engineer đối chiếu
→ gần L2 — AI Practitioner
→ cần nâng: Evals / phân tích lỗi theo mã ngoại lệ
→ 30 ngày: viết 30 ca gian lận có nhãn (FRD-02/03/05, ITM-01/02), chạy just eval 2 lần/tuần, ghi phân tích lỗi mỗi lượt
```

Khớp capability gap #4 ở Trang 3 và hàng 3 của RACI.

Growth Plan 30 ngày (tối đa 3 hành động)

Vấn đề	Hành động 30 ngày	Owner	Deadline	Dấu hiệu hoàn thành
Recall gian lận 30%, recall chỗ lệch 88,4%	Thêm 30 ca gian lận có nhãn vào bộ eval; thứ Hai và thứ Năm chạy `just eval` trên 300 HĐ, sửa luật FRD-02/03/05 và khớp dòng ITM theo phân tích lỗi. Linh nghiệm thu chéo.	Sơn	23/10 (trước Demo Day)	`eval/results/report.md`: recall gian lận ≥ 95%, recall chỗ lệch ≥ 98%, vẫn 0 HĐ sai mà 🟢.
Review và tích hợp dồn về tech lead	Từ 14/10: Linh ↔ Sơn review chéo; Thương chỉ review PR chạm `core/gateway`. Mỗi PR ghi người review trong mô tả.	Thương	Bắt đầu 14/10, đo lại 06/11	≥ 50% PR merge từ 14/10 → 06/11 không do Thương review; PR không chờ review quá 24 giờ.
Không ai nói ra vấn đề sớm; JOURNAL bỏ trống	Thứ Sáu hằng tuần retro 20 phút: mỗi người chấm lại 4 khía cạnh, chọn 1 việc sửa; Linh điều phối, ghi vào `JOURNAL.md`.	Linh	16/10 → 06/11 (4 buổi)	JOURNAL có đủ tuần 3–6; chênh điểm Tinh thần team ≤ 1 ở buổi 06/11.

Nhất quán giữa 4 trang. KTT Công ty X (Trang 1, #3) là người nhận pitch và là C trong RACI việc 1–2. Gap #2 "vận hành hạ tầng" và gap #4 "evals" ở Trang 3 chính là hai vấn đề Team Health ở trên (tech lead quá tải, chất lượng AI). Owner Growth Plan khớp RACI: Sơn là R của việc 3 và Linh là A (nghiệm thu chéo); Thương là A của việc 2 và 5. **Chia đều:** mỗi người là owner 1 hành động ở Trang 1, là A của ít nhất 1 việc RACI; Sơn, Thương, Linh mỗi người owner 1 hành động Growth Plan; Huy giữ pitch và buổi dùng thử.
